

3. Projektbegleitkreis

L 597, Neubau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Neckarbrücke

Webex-Meeting, am 07.10.2024



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Einleitung und Moderation

Philipp Ilzhöfer


Referent für Öffentlichkeitsbeteiligung
Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen
Regierungspräsidium Karlsruhe

Ziele der heutigen Veranstaltung:

- **informieren** über den aktuellen Stand der Baumaßnahme und die anstehenden Schritte
- **beantworten** Ihrer Fragen

RP Karlsruhe

Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen

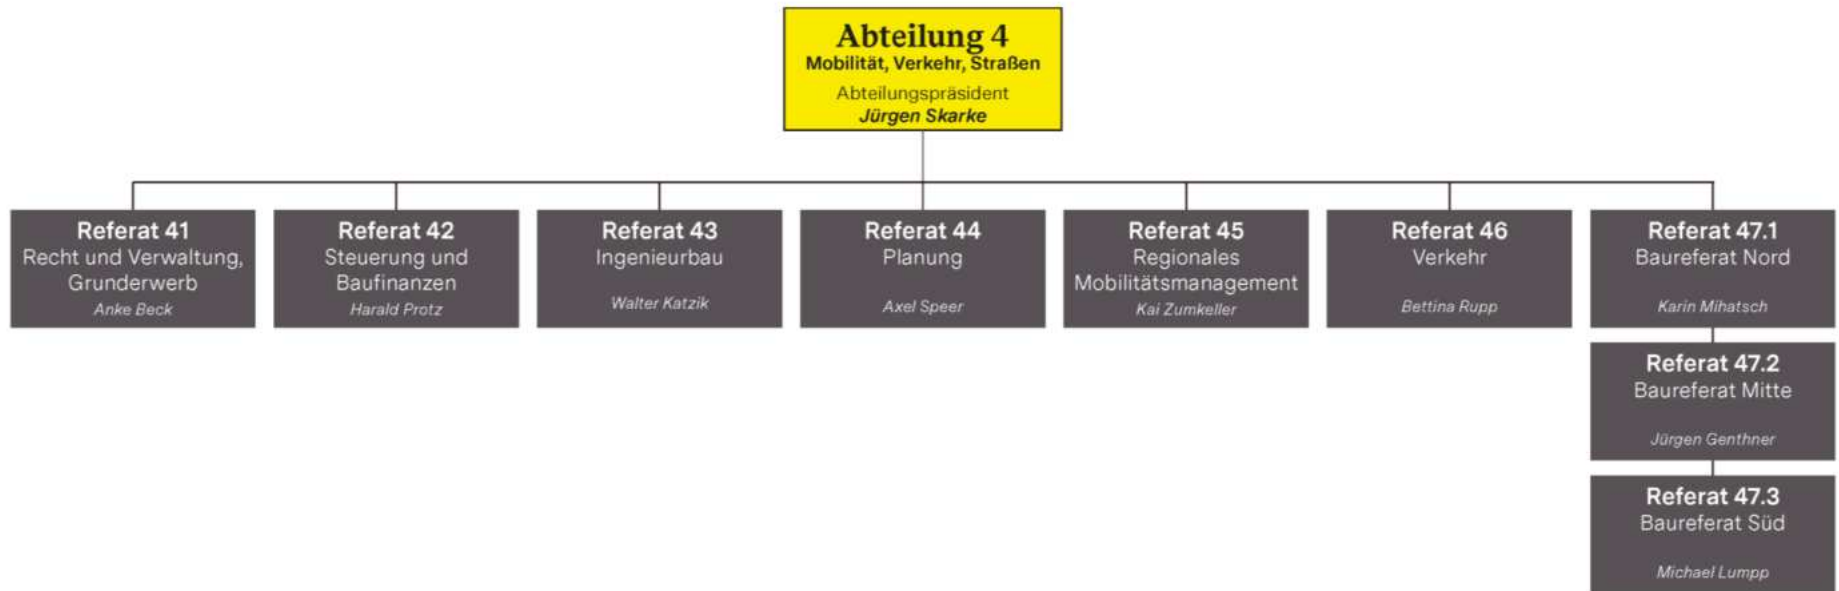

Agenda

1. Einleitung und Begrüßung
2. Information über den aktuellen Projektstand
 - 2.1 Was ist seit dem letzten PBK passiert?
 - 2.2 Was steht als Nächstes an?
3. Fragen aus dem Projektbegleitkreis
4. Ausblick

Begrüßung

Karin Mihatsch

Leiterin Baureferat Nord
Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen
Regierungspräsidium Karlsruhe

Kosten der Maßnahme

Bisherige Gesamtkosten (Stand Nov 2021)

→ 54,544 Mio. Euro

Aktuelle Gesamtkosten (Stand Aug 2024, Genehmigung Kostenfortschreibung VM Sep 2024)


→ 86,366 Mio. Euro

darin enthalten:

- Kostenanteil Neckarbrücke: 29,175 Mio. Euro
- Kostenanteil Radschnellweg: 8,940 Mio. Euro

vsl. Bundesförderung Radschnellweg: 6,705 Mio. Euro

Kostenzusammensetzung

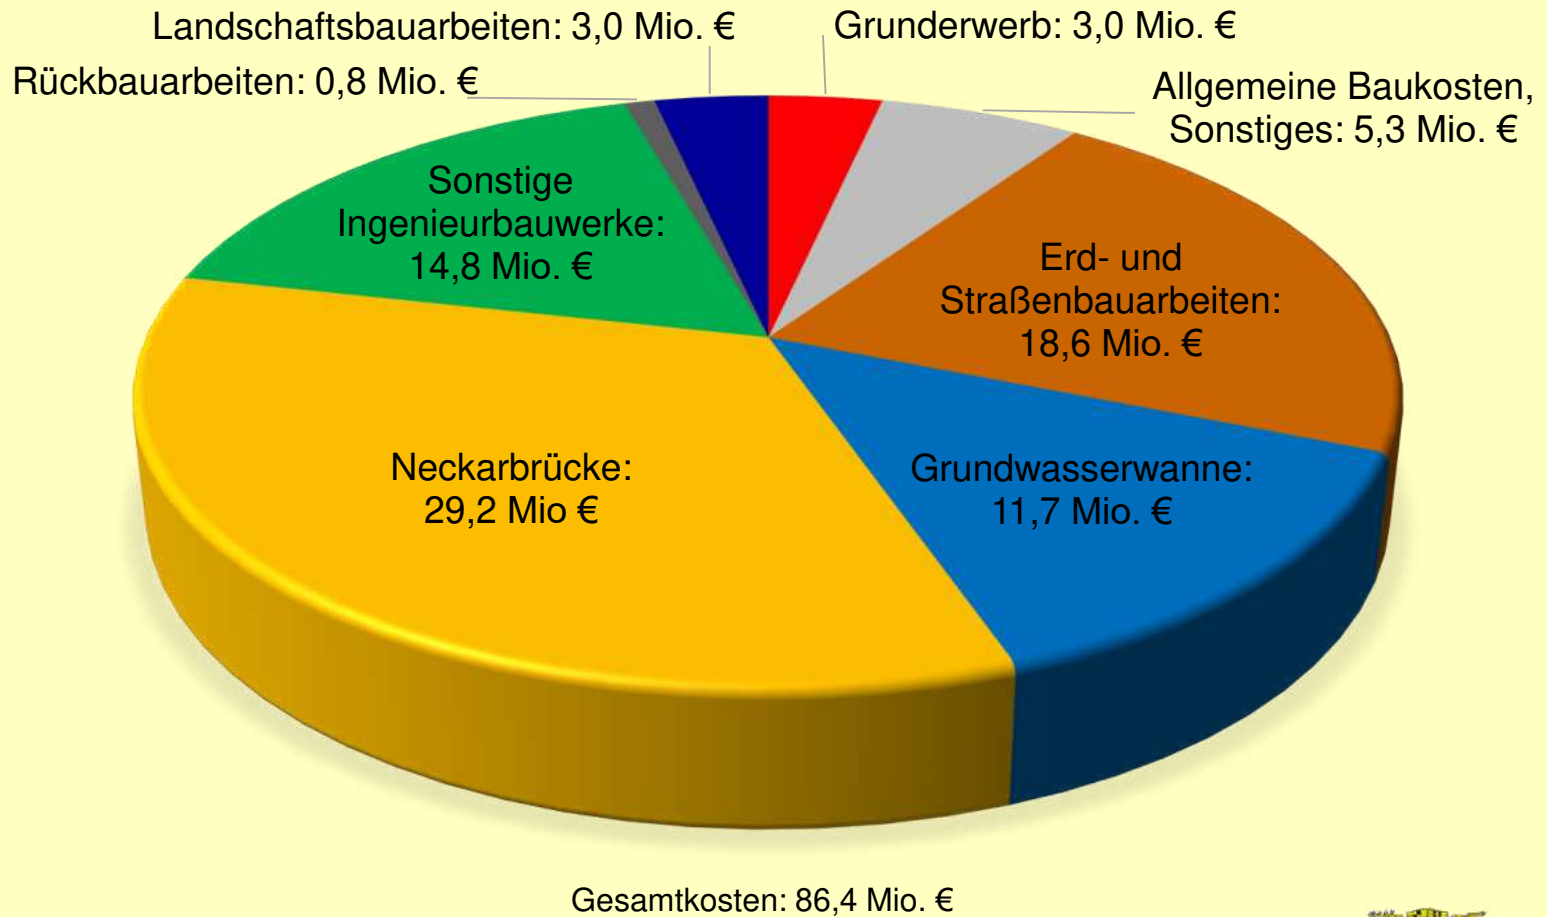

Gründe der Kostensteigerung

- Allgemeine Baupreissteigerung (27 % seit Nov 2021)
 - Auswirkungen globaler Ereignisse (Ukrainekrieg, Energiekrise) auf Produktion und Lieferketten von Baumaterialien.
- Regionale Marktlage
 - Ausschreibungsergebnisse teils deutlich höher als erwartet.
- Mehrkosten im Rahmen von Leitungsverlegungen
- Fortschreibung noch ausstehender Leistungen auf o.g. Basis

Aktuelle Bauzeit

Geplantes Bauende: Ende 2026

(Stand 2. PBK im Juli 2022 war Frühling 2026)

Wesentliche Gründe :


- Mehr Planungs- und Begleitaufwand für Bau der Grundwasserwanne aufgrund der komplexen Bauverfahren
- Vorbereitende Leitungsverlegungen im Bereich Erd- und Straßenbau Nord und Süd
- Intensive Vorbereitung der Ausschreibungen Neckarbrücke

Information über den aktuellen Projektstand


André Nieder

Projektleiter, Baureferat Nord
Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen
Regierungspräsidium Karlsruhe

Umfang der Maßnahme

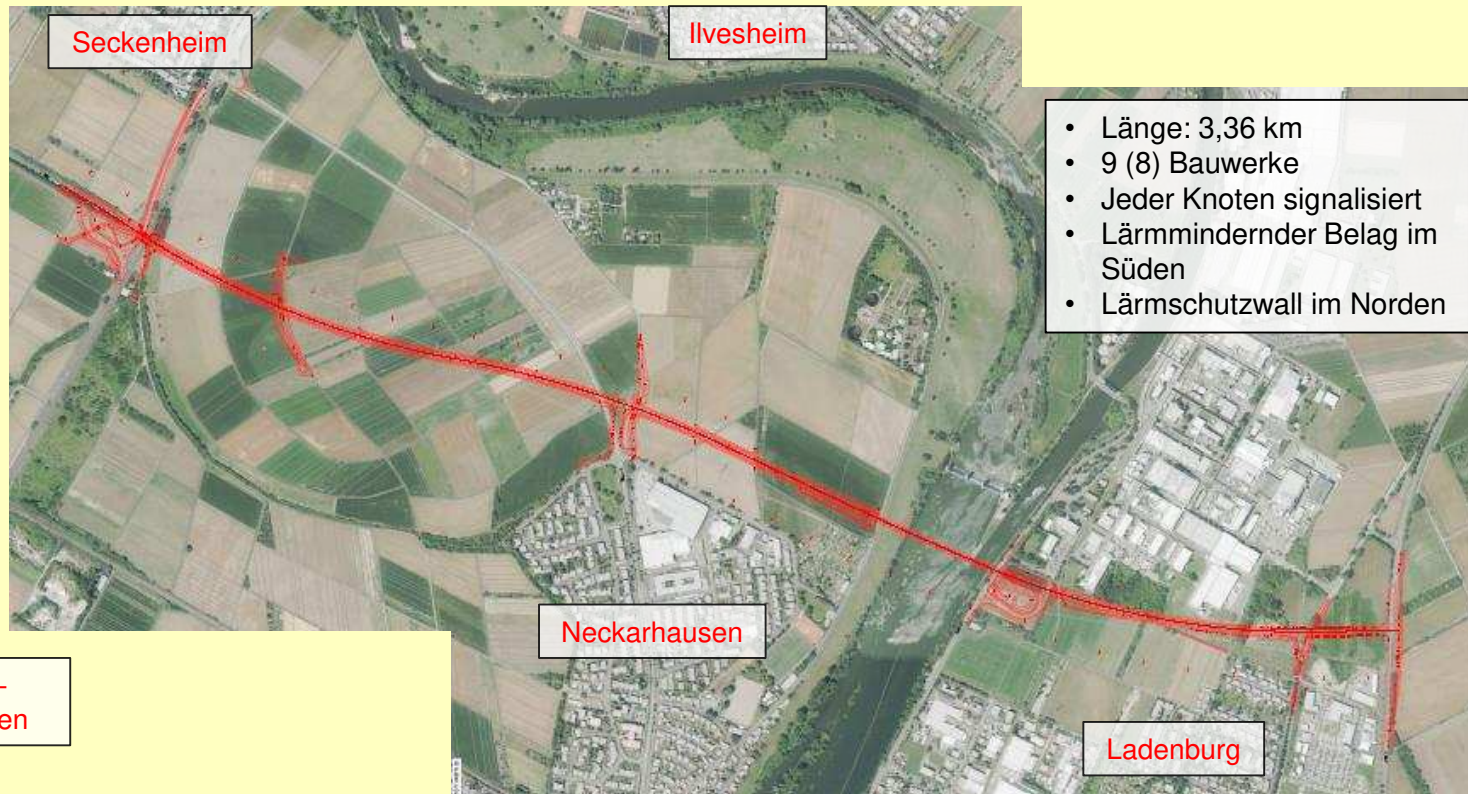

Aktuell im Bau Straßenbau Nord mit Bauwerk 8

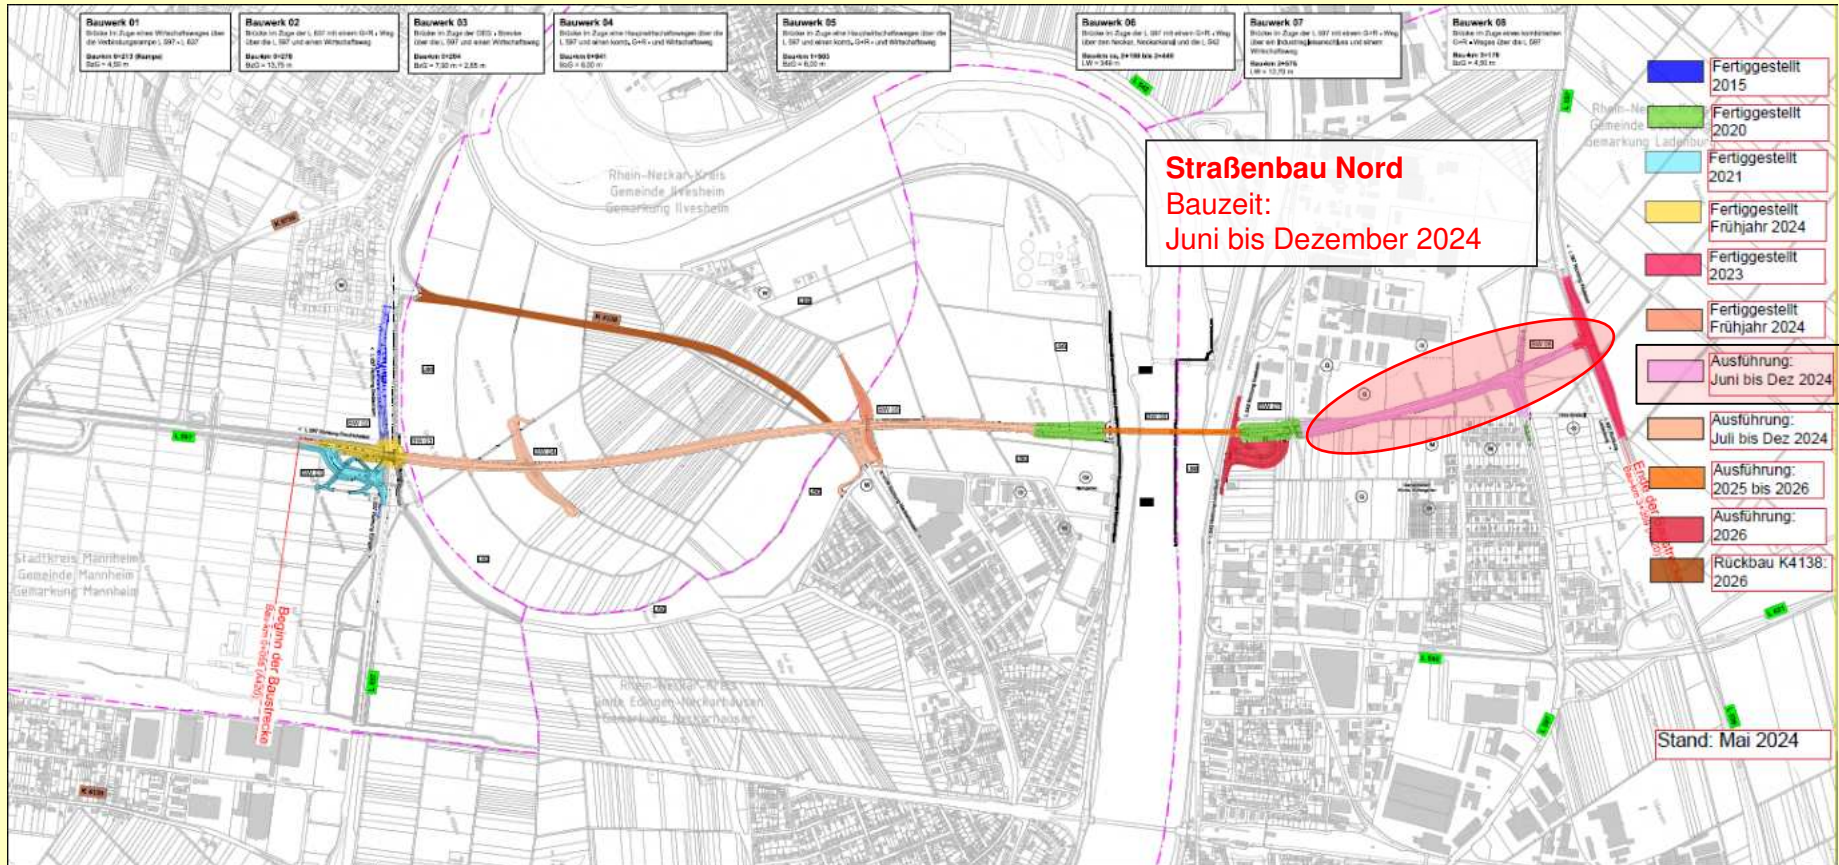

Aktuell im Bau

Straßenbau Nord mit Bauwerk 8

3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,



Aktuell im Bau




Aktuell im Bau



Aktuell im Bau



Aktuell im Bau Straßenbau Süd

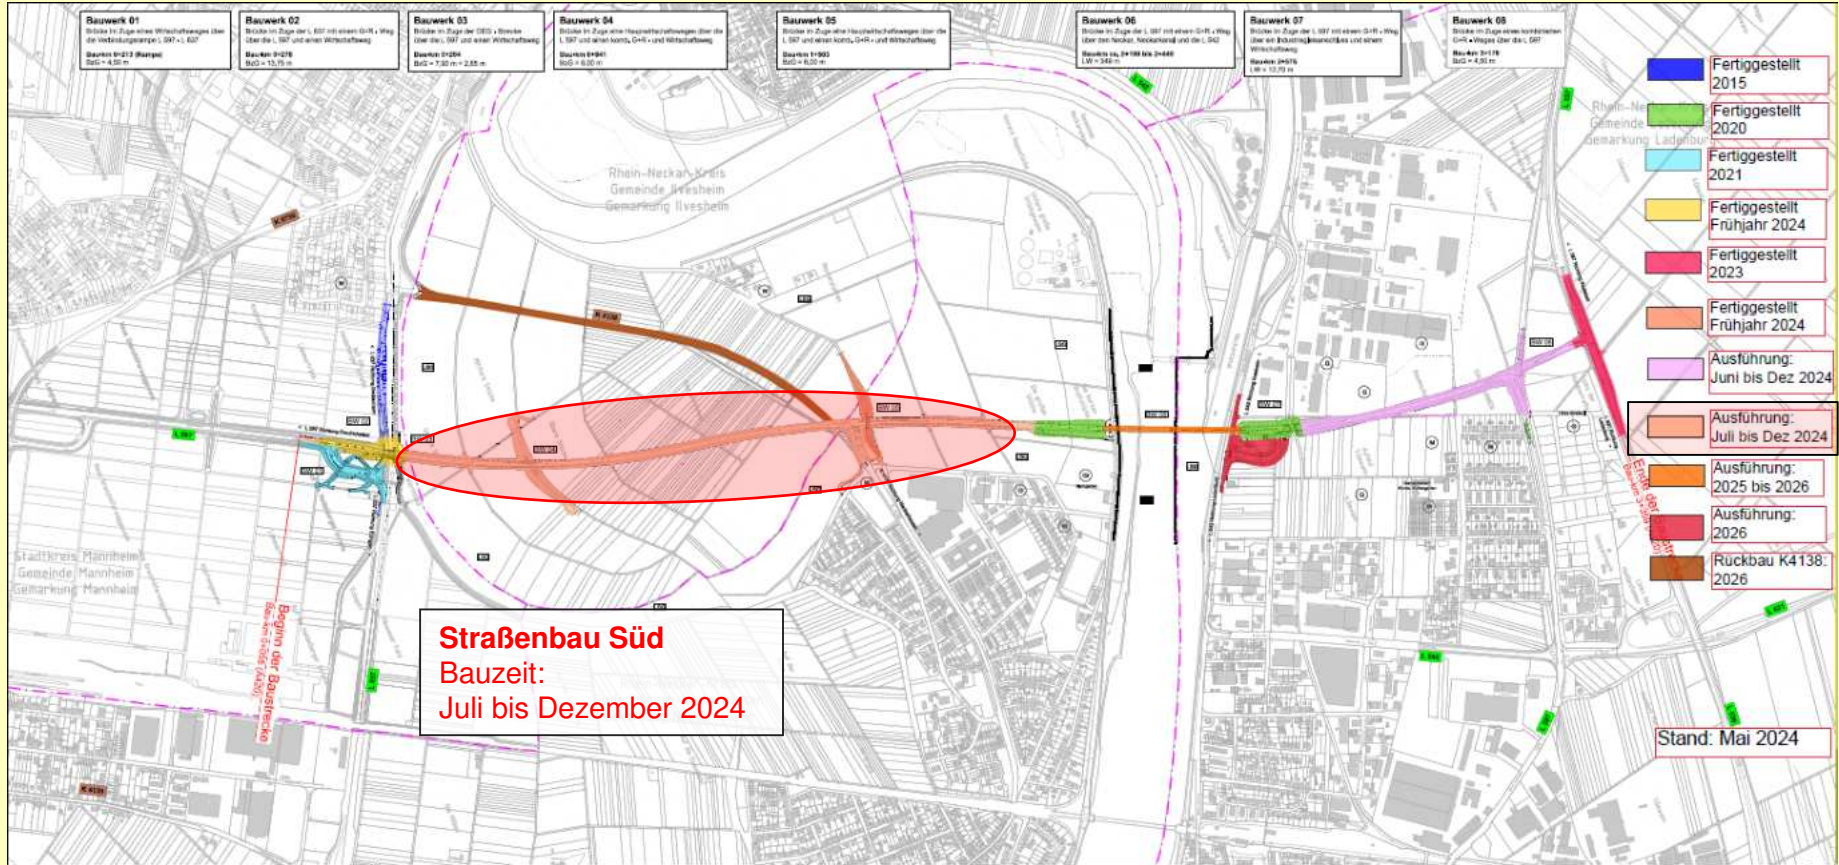

Aktuell im Bau Straßenbau Süd

3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,



Städter
Gemeinde
Gemarkung

teilt
teilt
teilt
teilt
2024
teilt
2024
ng:
ez 2024
ng:
ez 2024
ng:
2026
ng:
K4138:
24

Aktuell im Bau Straßenbau Süd

3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,



Aktuell im Bau Straßenbau Süd

3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,




Aktuell im Bau Straßenbau Süd

3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,



Anstehende Baumaßnahmen Bauwerk 6 (Neckarbrücke)

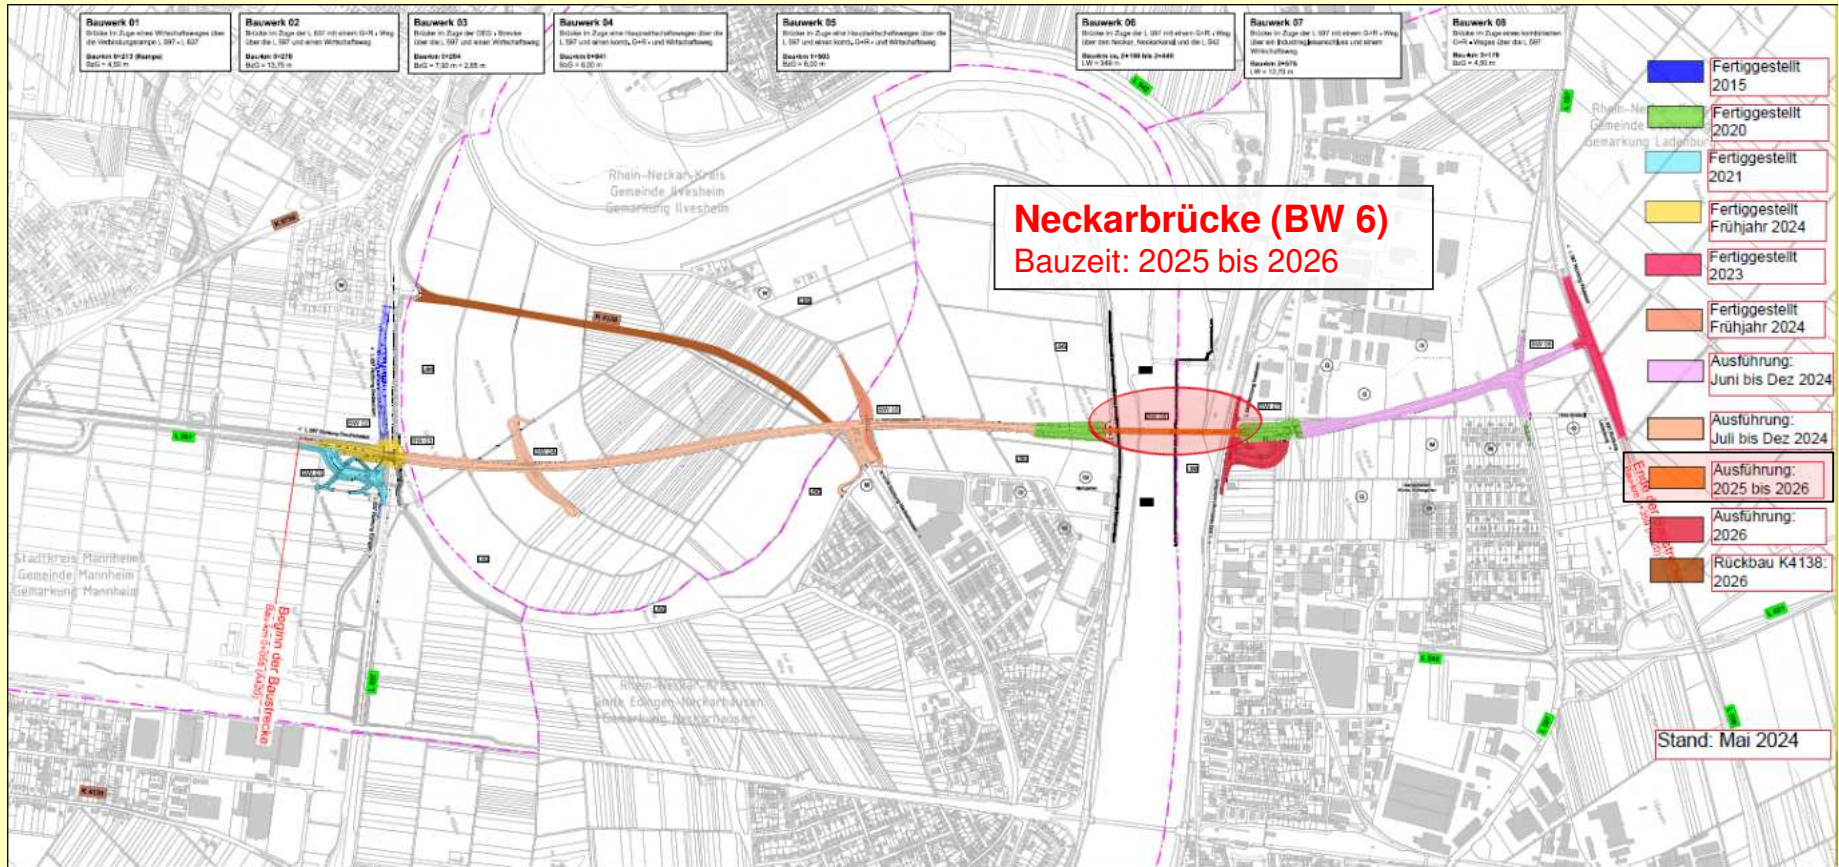


Anstehende Baumaßnahmen Bauwerk 6 (Neckarbrücke)


3. Sitzung PBK: L 597, OU Ladenburg,




Anstehende Baumaßnahmen Bauwerk 6 (Neckarbrücke)

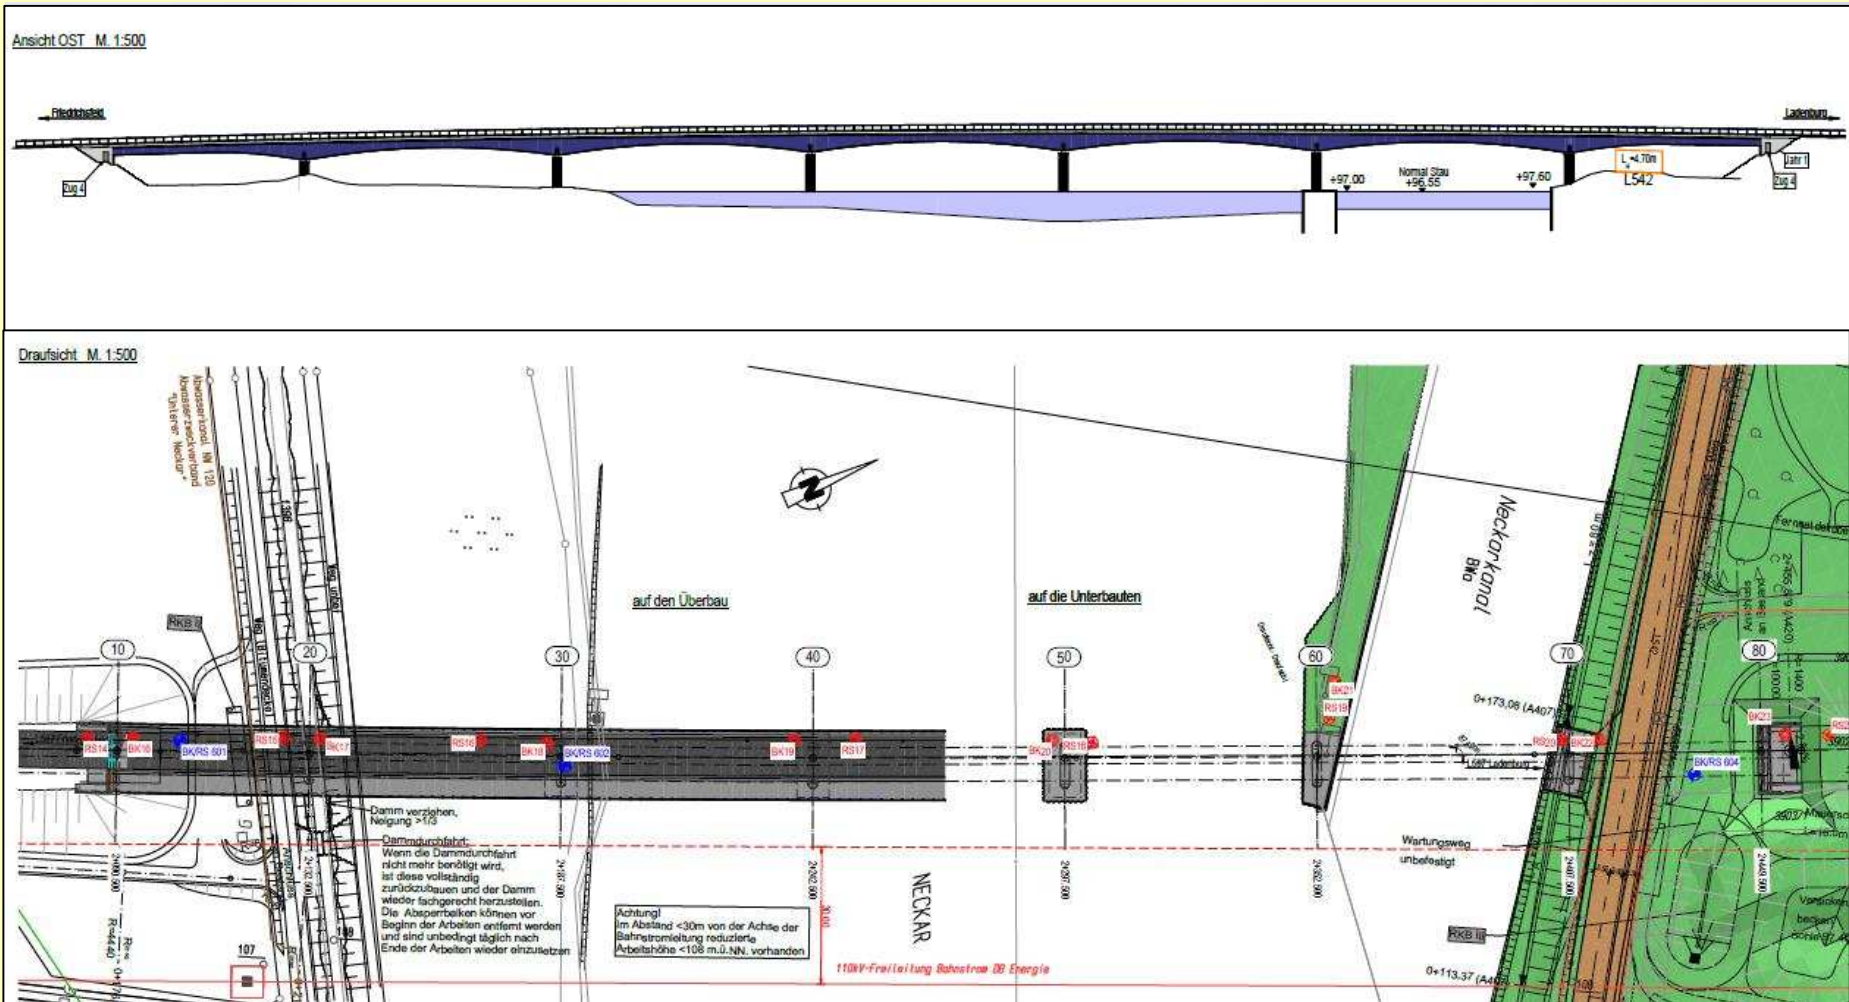


Anstehende Baumaßnahmen Bauwerk 6 (Neckarbrücke)

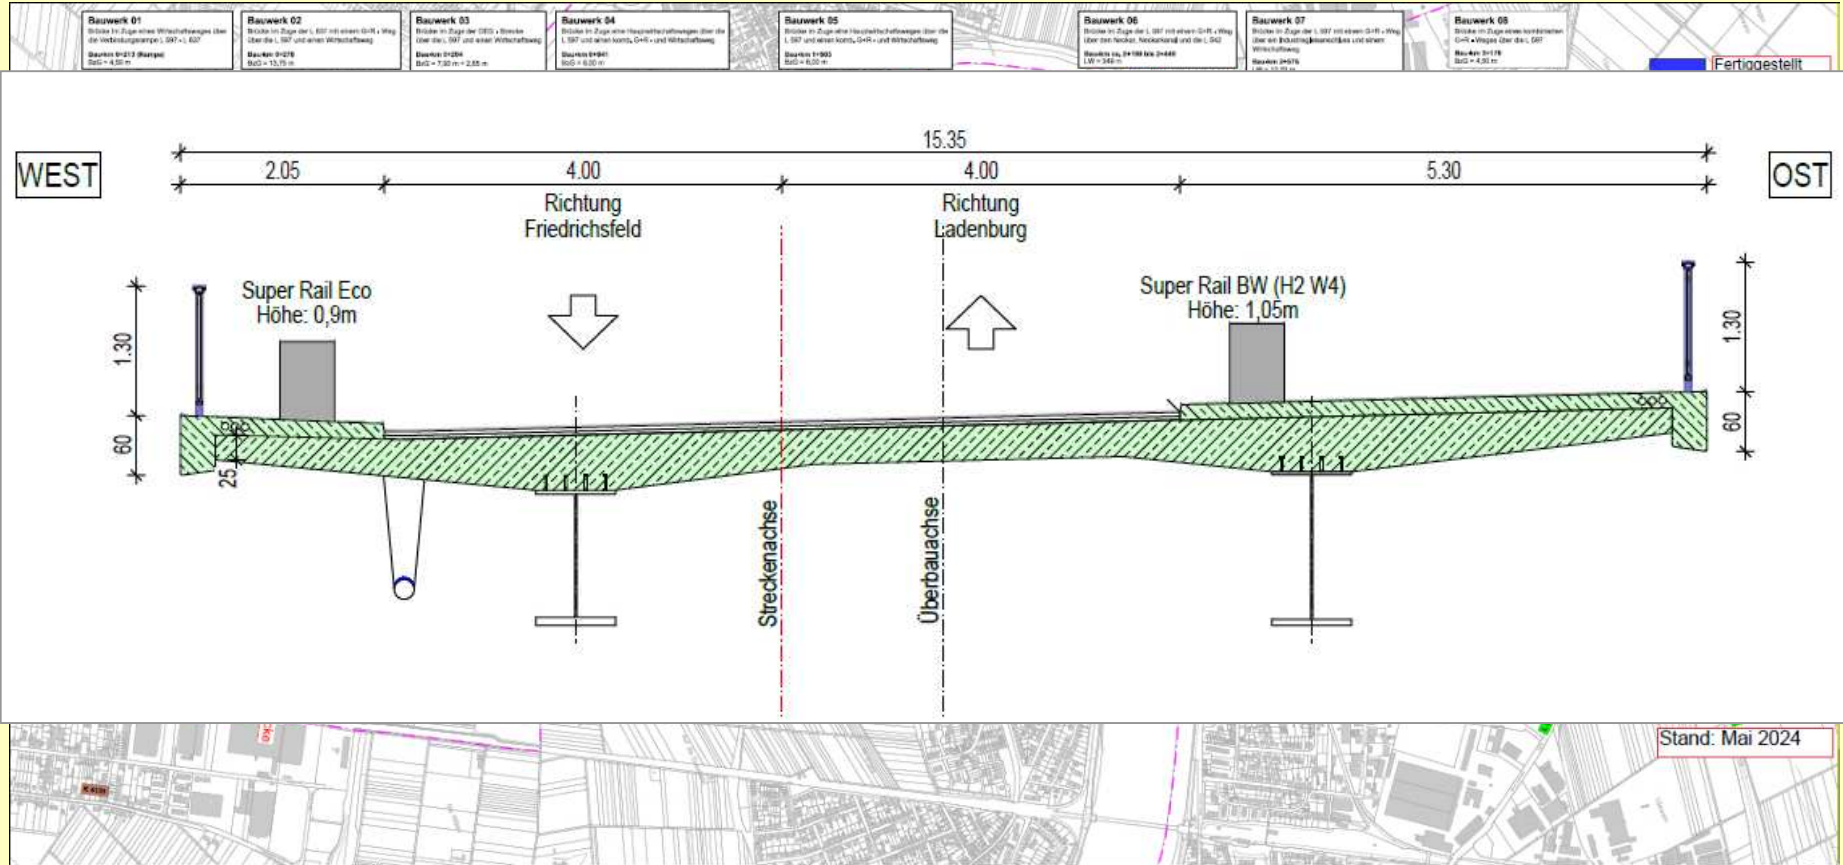

Anstehende Baumaßnahmen Knoten L 597 / 542, Rückbau K 4138

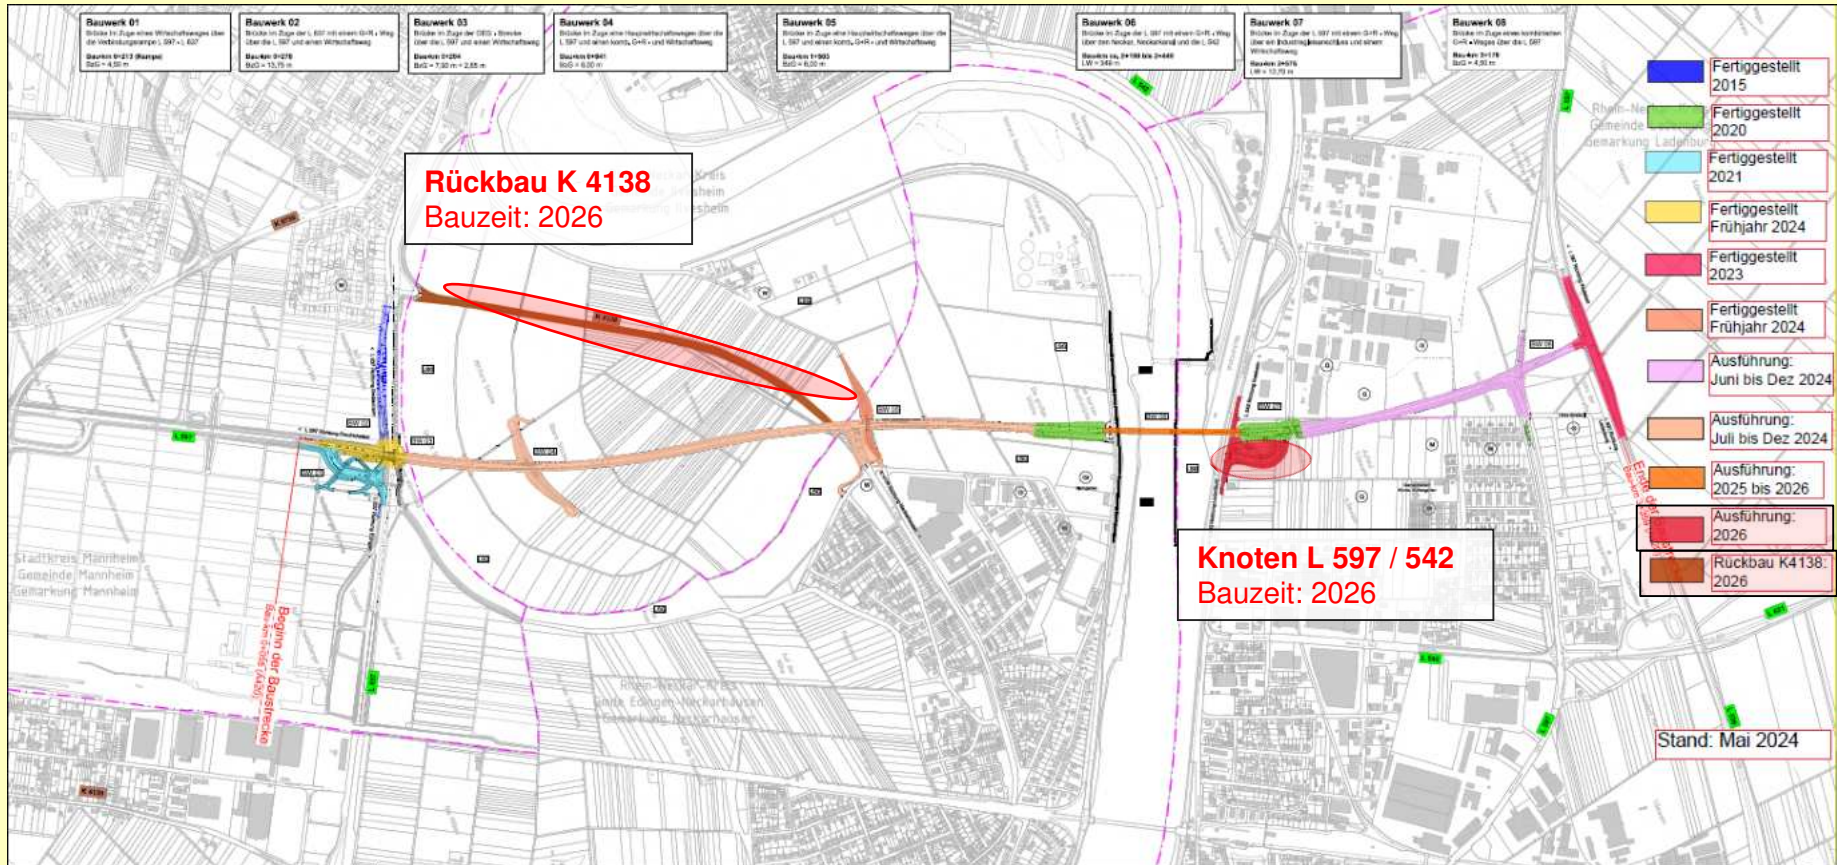

Anstehende Baumaßnahmen Knoten L 597 / 542, Rückbau K 4138

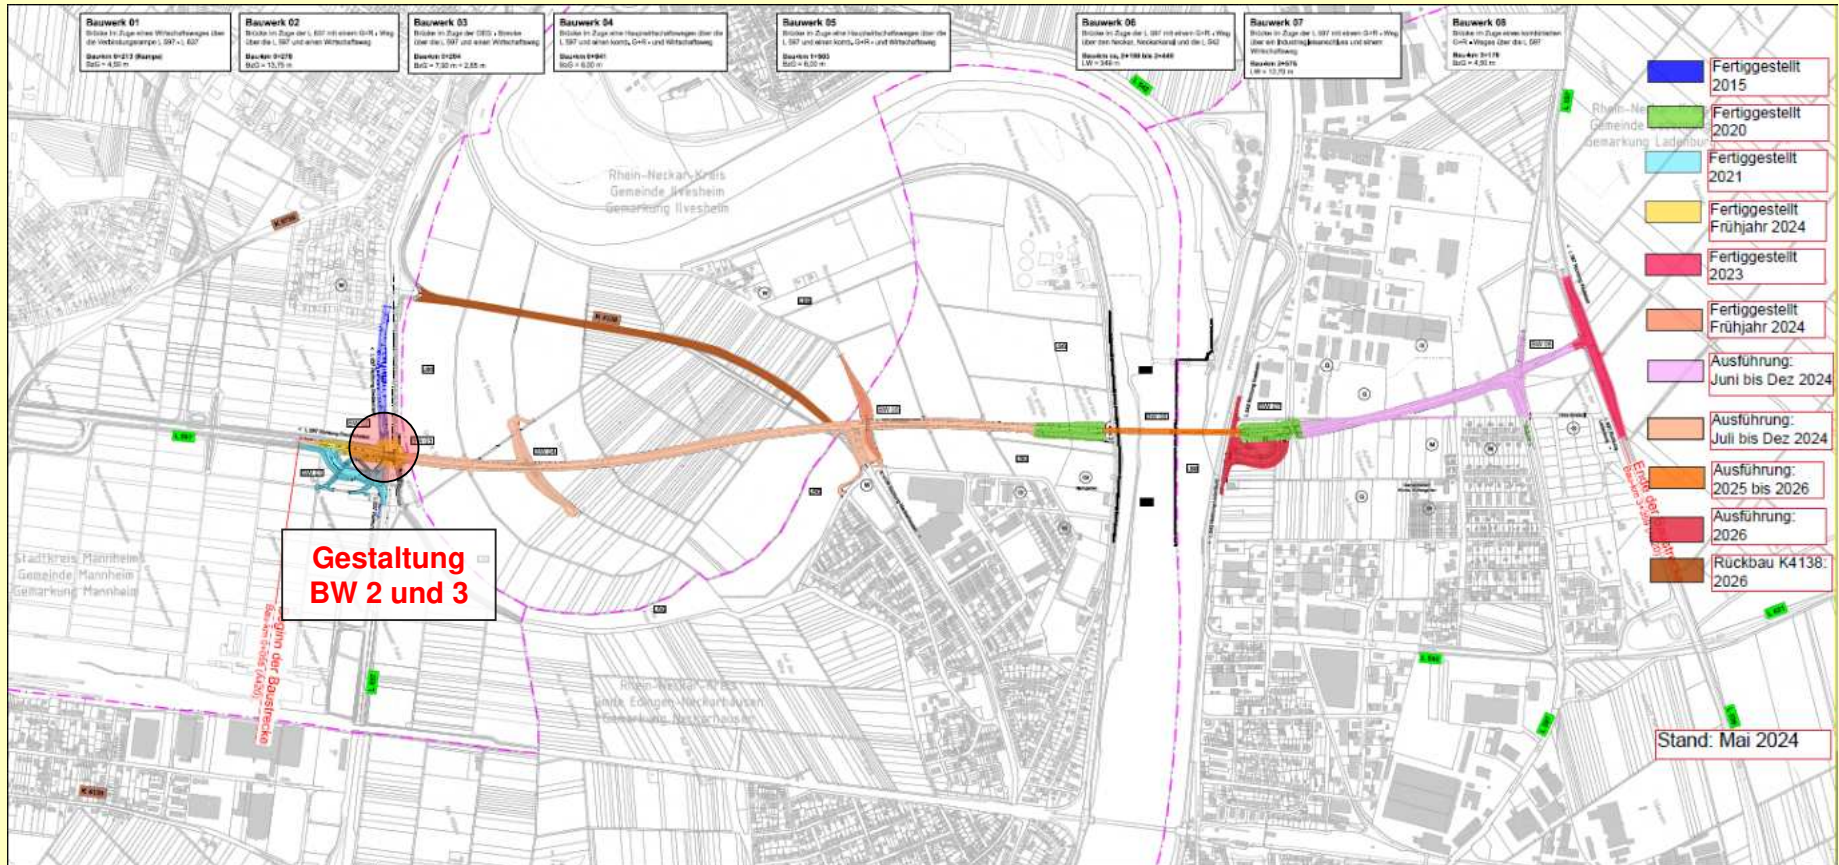

Graffiti Bauwerke 2+3 (vorher)



- übliches Vorgehen: Regelmäßige Reinigung der Betonwände
- Lösung hier: Ortsansässiger Künstler für **Graffiti & Streetart**

Graffiti Bauwerke 2+3 (nachher)

Felix Falkner (<https://www.forceof-nature.com/>)





Information zu Bauwerk 4


Axel Speer

Leiter Referat Planung


Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen


Regierungspräsidium Karlsruhe


Entfall Wirtschaftswegbrücke Bauwerk 04

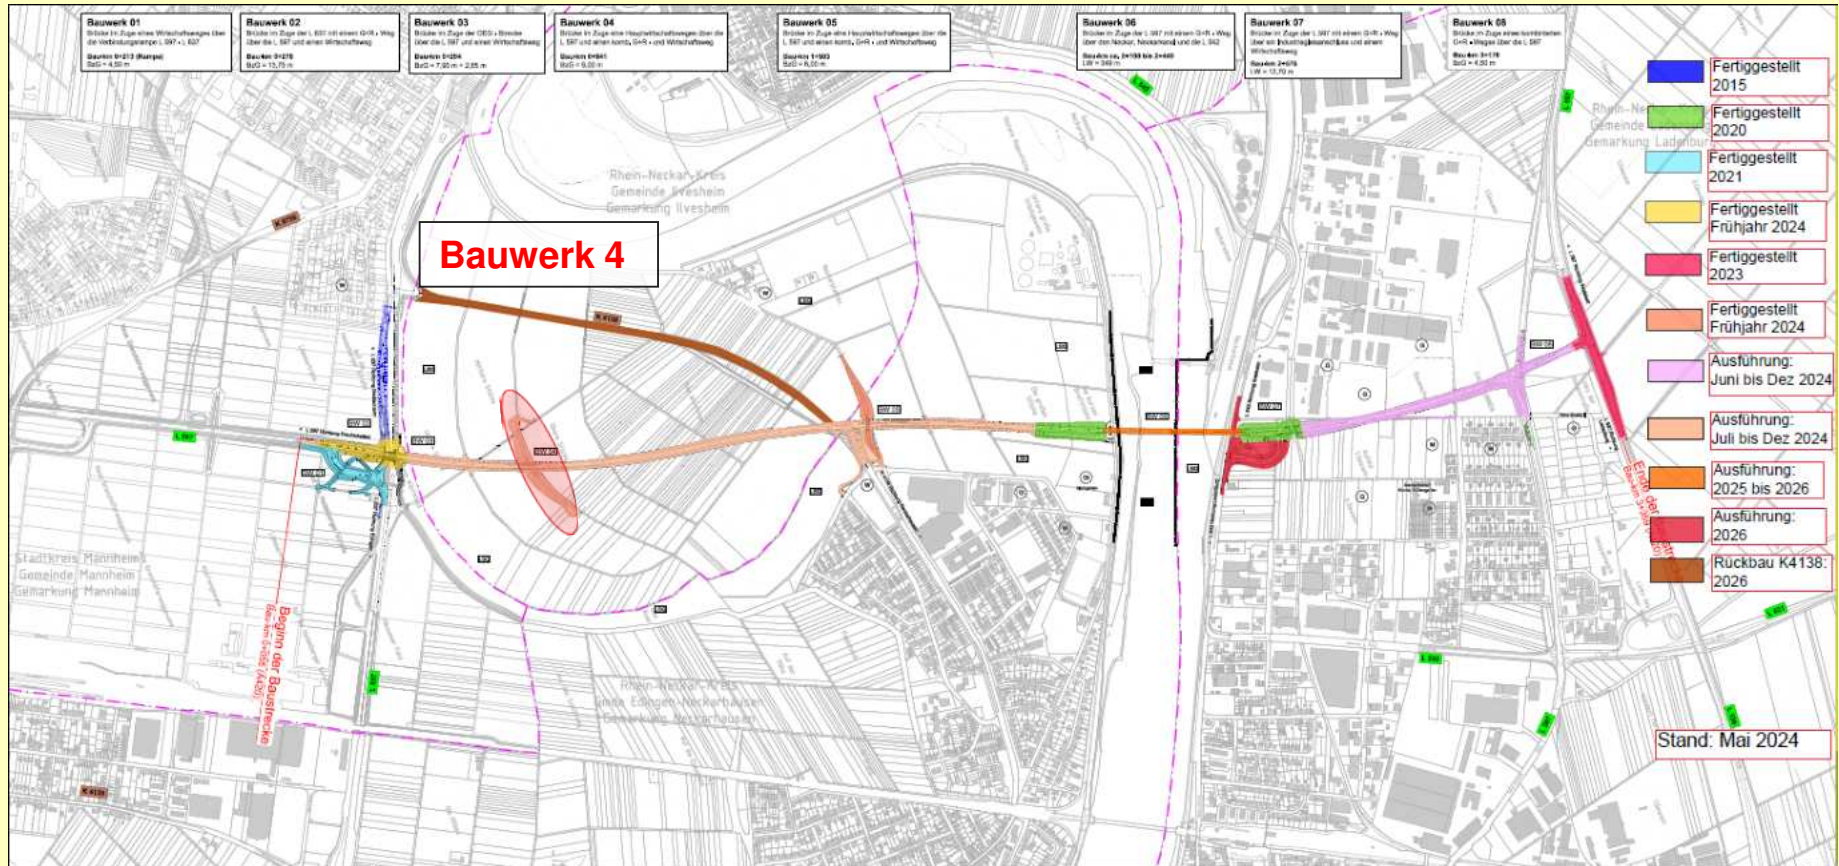

Grunderwerb entsprechend Planfeststellung

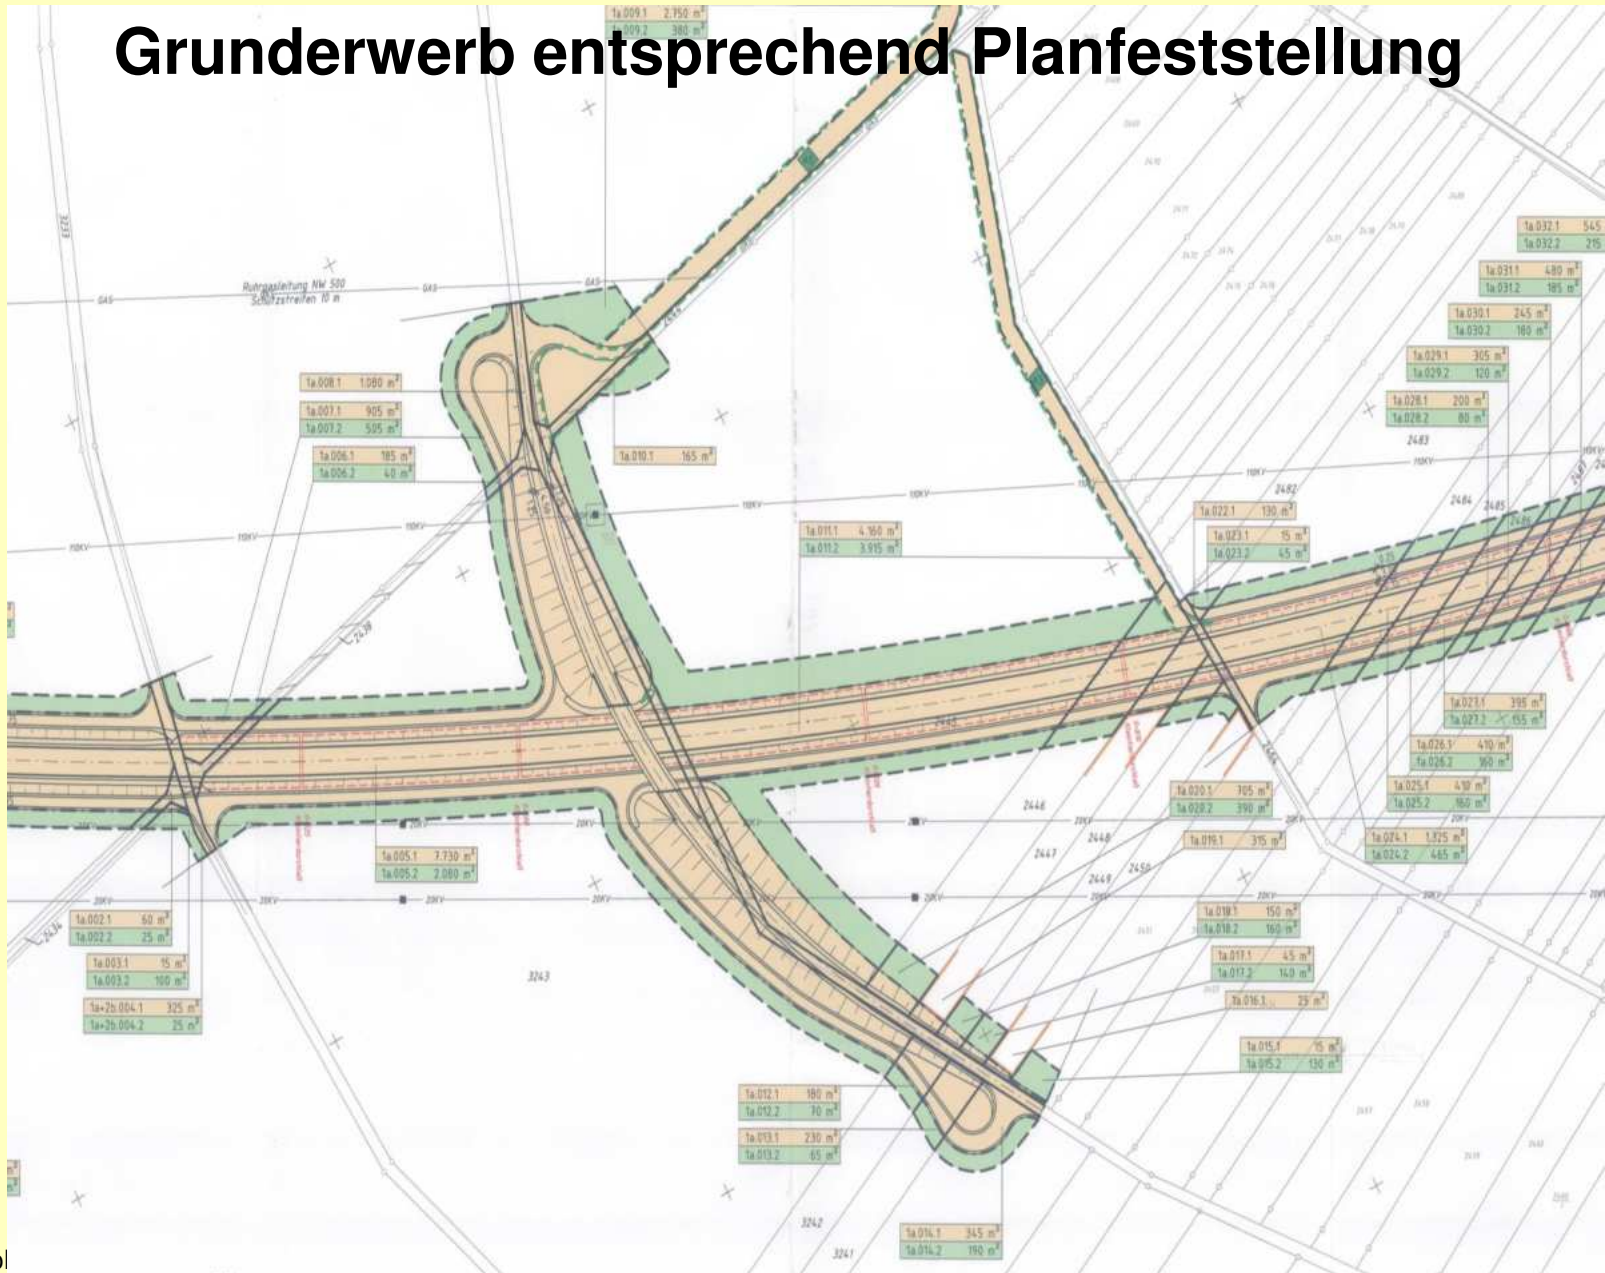

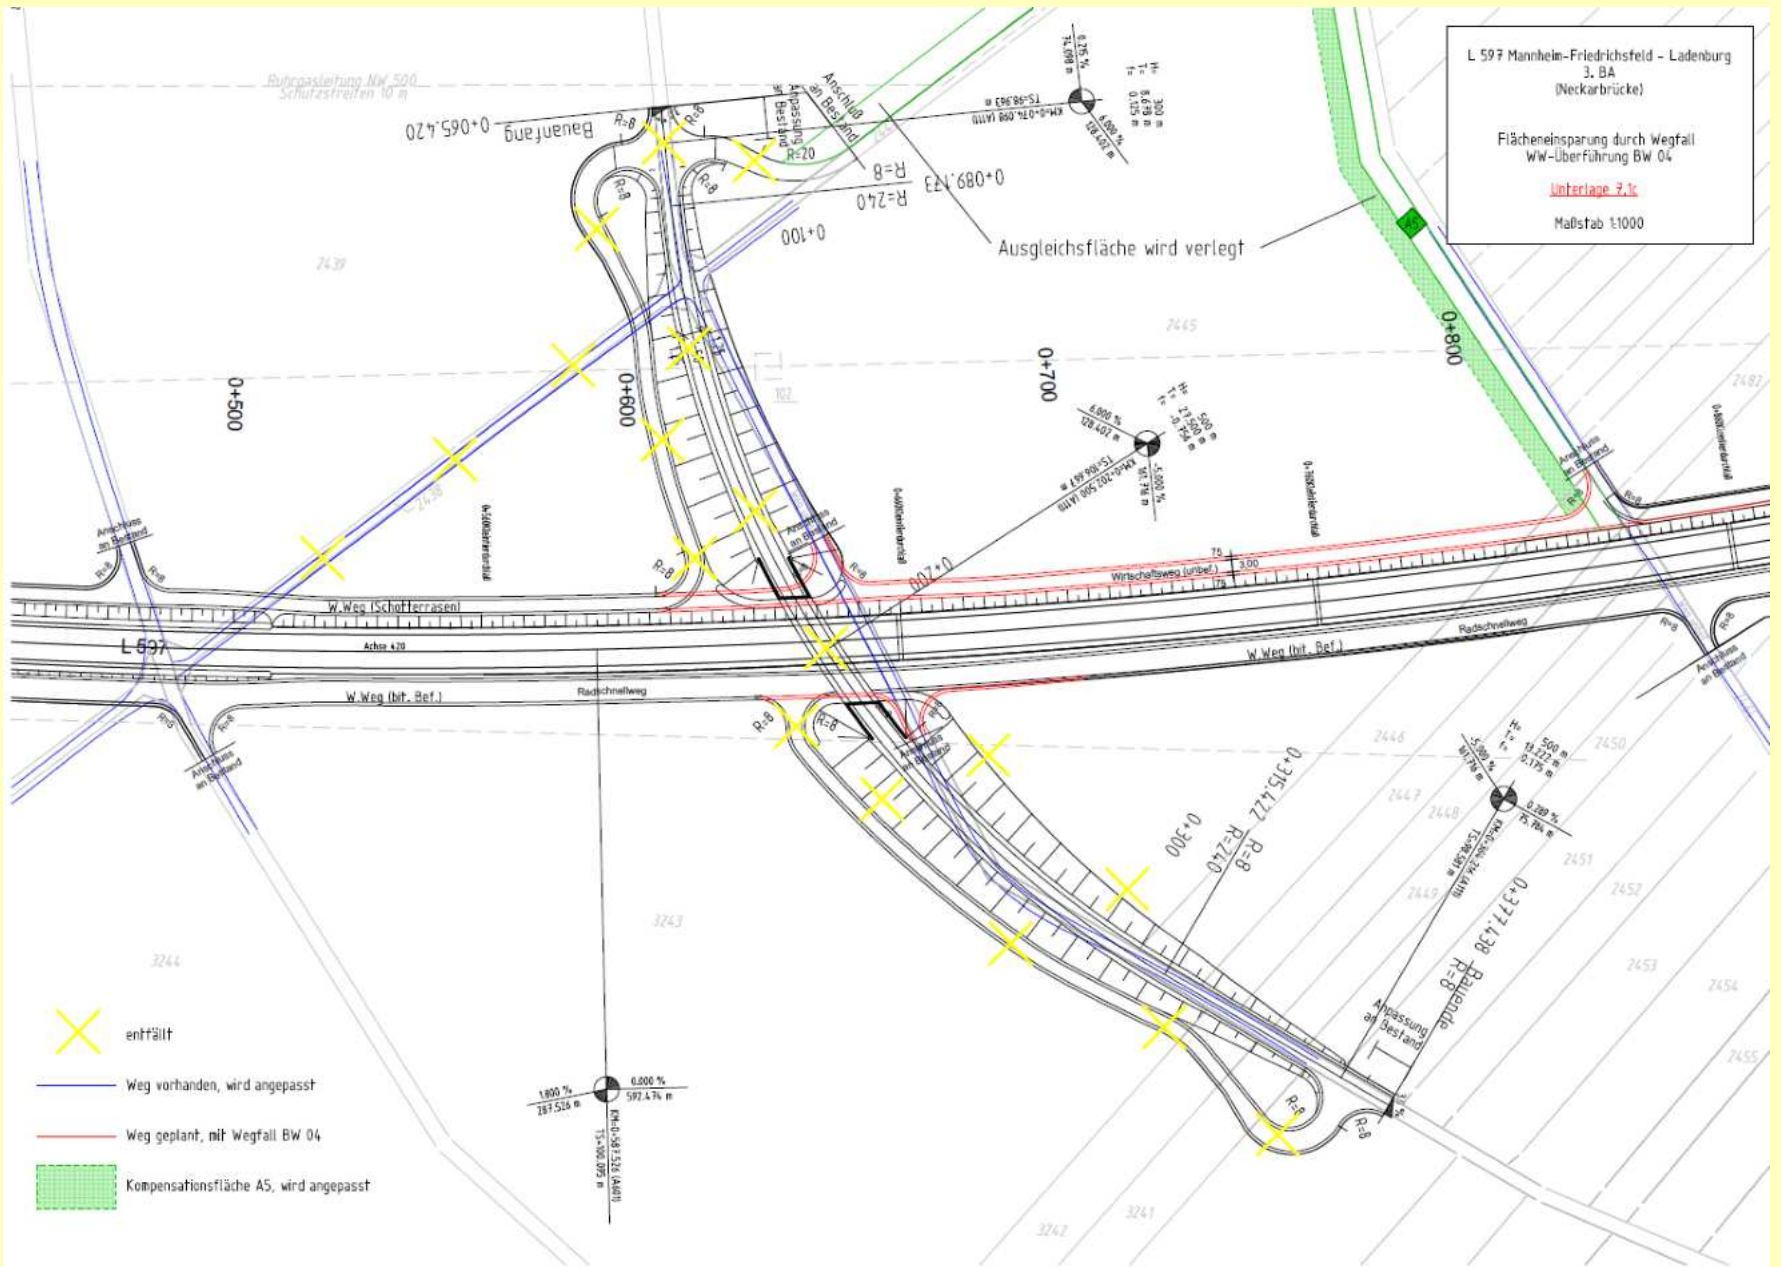

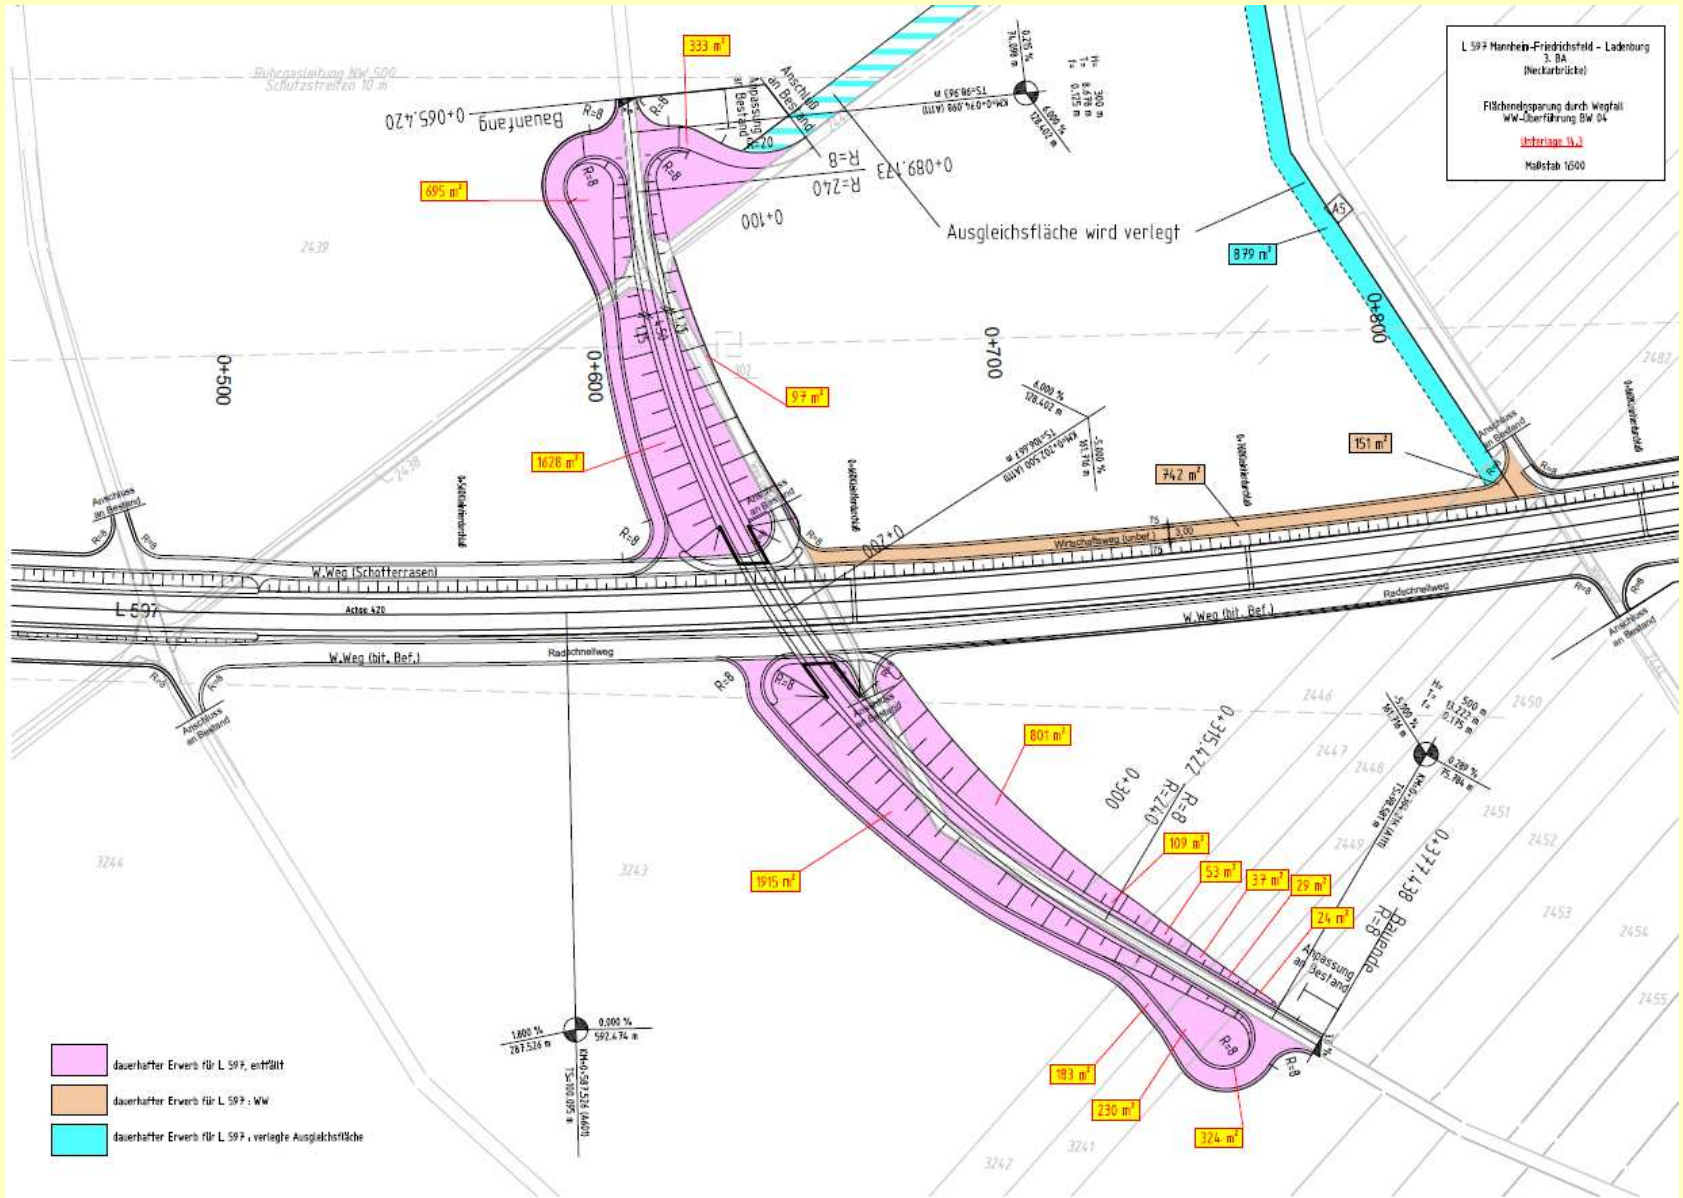



Wirtschaftswegenetz Entfall BW 04



Ausblick

Baubeginn Neckarbrücke / Spatenstich Radschnellweg RS2

im Frühjahr 2025

Gelegenheit für Ihre Fragen



Wie bleiben Sie informiert?

- Pressemitteilungen: Versand vorab an PBK
- Projektwebseite
 - www.rp-karlsruhe.de, Navigation:
 - Über uns
 - Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen
 - Aktuelle Straßenbaumaßnahmen
 - L 597, Neubau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Neckarbrücke
 - oder direkt [hier](#)

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Projektleiter (RP Karlsruhe)

André Nieder

06221 1375 142

andre.nieder@rpk.bwl.de

Öffentlichkeitsbeteiligung (RP Karlsruhe)

Philipp Ilzhöfer

0721 926 2747

philipp.ilzhoefer@rpk.bwl.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!
